



MINUTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA POR EL GRUPO DE TRABAJO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) EN SU CARÁCTER DE ÓRGANO AUXILIAR DEL COPLADE

22 de abril 2021

ANTECEDENTES

La constitución del Grupo de Trabajo del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades se realizó formalmente el 7 de diciembre de 2017 dentro del marco de la Segunda Asamblea Plenaria del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Chihuahua con el objeto de dar seguimiento a las obras y acciones programadas del ejercicio presupuestal 2018 (FISE).

De conformidad con lo establecido en el Título Tercero, Capítulo II, Artículo 22, del Reglamento Interior del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (COPLADE), en la ciudad de Chihuahua, Chih., **siendo las 12:00 horas del día 22 de abril de dos mil veintiuno**, se celebró una reunión del Grupo de Trabajo del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades en su carácter de Órgano Auxiliar del COPLADE, conformada por representantes de los Gobiernos Federal y Estatal cuyos nombres aparecen en el Anexo 1 de la presente Acta quienes sesionaron y tomaron acuerdos bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA.

1. Lista de asistencia
2. Seguimiento a las obras y acciones programadas en el FISE correspondiente al Ejercicio Presupuestal 2021.
3. Cancelación y reprogramación de obras.
4. Toma de Acuerdos.

PUNTO 1. Lista de asistencia

De acuerdo a la lista de asistencia y con la concurrencia registrada, se cubren los requisitos para la celebración de la sesión. **(Anexo 1)**

PUNTOS 2. Seguimiento a las obras y acciones programadas en el FISE correspondiente al Ejercicio Presupuestal 2021

El Ing. Mario Alonso García Durán, Director de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda, informó que de los \$183,862,412.00 asignados para el FISE 2021 se han aprobado \$164,061,103.18, es decir el 89.23% asignados como se muestra en la siguiente tabla:

4



DEPENDENCIA / EJECUTOR	PROYECTOS	MUNICIPIOS	LOCALIDADES	APROBADO	EJERCIDO	SALDO
RECURSOS A INVERTIR	183,862,412.00			89.23%	0.00%	
TOTAL	260	31	190	164,061,103.18	0.00	164,061,103.18
COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	24	12	24	14,974,186.73	0.00	14,974,186.73
SECRETARIA DE CULTURA	1	1	1	26,496,313.80	0.00	26,496,313.80
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	173	28	141	21,136,100.00	0.00	21,136,100.00
PRESIDENCIAS MUNICIPALES	52	8	34	48,821,161.58	0.00	48,821,161.58
SECRETARIA DE SALUD	2	1	1	14,371,226.12	0.00	14,371,226.12
SECRETARIA COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	6	2	2	19,470,000.00	0.00	19,470,000.00
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	2	1	1	18,792,114.95	0.00	18,792,114.95

Menciona que están pendientes por aprobar \$19,801,308.82 correspondientes a obras en los municipios de Guadalupe y Calvo, Santa Bárbara, Satevó y Chihuahua, a los cuales se les está dando seguimiento.

PUNTO 3. Cancelación y reprogramación de obras

El Mtro. Javier Antonio Ferreiro Burdick, Director General de Seguimiento de la Coordinación Ejecutiva de Gabinete expone los ahorros y cancelaciones, los cuales suman un monto de \$11,322,139.15 mismos que se muestran en la siguiente tabla:

PROYECTO	EJECUTOR	Municipio	Ahorros y cancelaciones FISE (\$)	Comentario
Construcción de Hornos libres de humo	FODARCH - SIDE	Zona serrana	693,311	Se cancela ya que no se incluyeron estas obras en el catálogo 2021, publicado después de la reunión de aprobación.
Rehabilitación de Plaza Frontones en la Ciudad Deportiva	SDUE-SCOP	Chihuahua	816,520	Ahorros por licitación
Rehabilitación de la Plaza Discóbolo en la Ciudad Deportiva	SDUE-SCOP	Chihuahua	774,761	Ahorros por licitación
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (LOS CORRALES).	Municipio	Nonoava	295,782	Se cancela ya que se priorizaron otras obras por recurso estatal.
Construcción de Puente sobre el Arroyo Los Muertos ubicado en el cruce de la calle 13ª y calle Benito Juárez en la Comunidad de La Mesa, en el Municipio de Aldama, Chih.	SCOP	Aldama	3,000,000	Se cancela, ya que el municipio y la SCOP recatalogaron la obra es de bajo impacto.
Equipamento de comedores + Comedores modulares + Lavamanos	DIF	Zona serrana	2,169,430	Ahorros por licitación
CESSA Tierra Nueva			586,788	Ahorros por licitación
Biblioteca Juárez			2,949,156	Ahorros por licitación (0.4mdp disponibles)

TOTAL 11,285,748

Como siguiente punto se puso a consideración la propuesta de las siguientes obras:

PROYECTO	EJECUTOR	Municipio	Propuesta FISE (\$)	Comentario
Construcción Mini Ciudad Vial en Deportiva Sur (2ª Etapa)	SDUE-SCOP	Chihuahua	2,916,209	Se aprobaron 2.4mdp la sesión anterior para una primera etapa. Se solicita recurso para la 2a etapa y conclusión del proyecto. Valor total 5,279,611.65
CDIIA (2a Etapa)	SDS - SCOP	Chihuahua	4,155,456	En 2020 se ejecutaron 4.6 mdp para una 1a etapa. Se solicitan 4.2 mdp adicionales para la 2a etapa. Se estará dejando las canchas de usos múltiples para una 3a etapa
Rehabilitación de la Alberca Santo Niño (2a etapa)	ICHD	Chihuahua	1,250,000	A través de recurso estatal se invertirán 2.2mdp. Se solicitan 1.25 mdp de inversión adicional de FISE.
Pavimentación de 5 calles en Aldama	SCOP	Aldama	2,964,084	Propuesta del Mpio y SCOP en sustitución al puente sobre arroyo Los Muertos
TOTAL			11,285,748	

El Dr. José Antonio Pérez Sánchez, Director de Desarrollo Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología expone la propuesta de la Construcción de la Mini Ciudad Vial en la Deportiva Sur en el municipio de Chihuahua, por un monto total de 5.2 mdp de los cuales, se aprobaron en Asamblea Plenaria el 22 de febrero 2.4 mdp para una primera etapa; se propone la ampliación por 2.9 mdp para la terminación total del proyecto. **(Anexo 2)**

A continuación, el Lic. Ramón Eduardo López Rey de la Secretaría de Desarrollo Social expone la propuesta para la construcción de la segunda etapa del Centro para el Desarrollo en la Infancia y Adolescencia en la colonia Vistas Cerro Grande de la ciudad de Chihuahua por un monto de \$4,155,456.00, quedando pendiente para una tercera etapa la construcción de una cancha de usos múltiples con una inversión de 1.1 mdp. **(Anexo 3)**

La siguiente propuesta fue la rehabilitación de la instalación denominada Alberca Santo Niño presentada por el Ing. Enrique Prieto Fierro, subdirector del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física, por un monto de 1.25 mdp; destaca que el monto total del proyecto es de 3.45 mdp, de los cuales 2.2 son aportación estatal. **(Anexo 4)**

Por último, el Ing. Raúl Sáenz Villalobos, de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, presenta la propuesta del cambio de proyecto en el municipio de Aldama del puente ubicado sobre el Arroyo Los Muertos por 5 pavimentaciones en la cabecera municipal. **(Anexo 5)**



PUNTO 4. TOMA DE ACUERDOS

PRIMERO. – Se acuerda la cancelación de las obras: **1)** Construcción de Hornos libres de humo por un monto de \$693,311.00, ya que este tipo de obra no está incluida en el catálogo 2021, publicado después de la reunión de aprobación, **2)** Ampliación de red de distribución eléctrica (Los Corrales) por un monto de \$295,782.00 ya que se priorizaron otras obras con recurso estatal y **3)** Construcción de Puente sobre el Arroyo Los Muertos ubicado en el cruce de la calle 13ª y calle Benito Juárez en la Comunidad de La Mesa, en el Municipio de Aldama, Chih. por un monto de \$3,000,000.00.

Así mismo, se acuerda la reasignación de los recursos disponibles por ahorros en 4 licitaciones por \$4,347,499.00.

SEGUNDO. - Se aprueba la reprogramación de \$2,916,209 para la 2a etapa y conclusión de la construcción de la Mini Ciudad Vial en la Deportiva Sur en el municipio de Chihuahua.

TERCERO. - Se aprueba la reprogramación de \$4,155,456.00 para la construcción de la segunda etapa del Centro para el Desarrollo en la Infancia y Adolescencia en la colonia Vistas Cerro Grande de la ciudad de Chihuahua.

CUARTO. - Se aprueba la reprogramación de \$1,250,000 para la rehabilitación de la Alberca Santo Niño ubicada en la ciudad de Chihuahua.

QUINTO. - Se aprueba el proyecto de 5 pavimentaciones en la cabecera municipal de Aldama por un monto de \$2,964,084.

**COORDINADOR GENERAL DEL GRUPO
DE TRABAJO DEL FISE**

ING. MARIO ALONSO GARCÍA DURÁN
Director de Programas de Inversión de la
Secretaría de Hacienda

**SECRETARIO TÉCNICO DEL GRUPO DE
TRABAJO DEL FISE**

LIC. VERÓNICA VILLEGAS GARZA
Enlace FAIS de la Secretaría del Bienestar

GRUPO DE TRABAJO DEL FISE
22 DE ABRIL 2021





COPLADE

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Raúl O. Sáenz Villalobos	Jefe de la División de Control de Recursos (SIOP)	
José Luis Esparza Corral	ASESOR TÉCNICO SECRETARÍA DE DESARROLLO MPAL	
JESUS HUMBERTO GONZALEZ LERMA	ASESOR TÉCNICO DIRECCIÓN DE PROG. DE INVERSIÓN	
Ana Luisa Consero Rojas	Jefa del depto. COPLADE	
Javier Ferreras	Of. Seguimiento / CEG	
Mario Alonso García Durán	Director de Programas de Inversión	
Osvaldo Tuvarez R	ICHD.	
Enrique Apóstolo F.	ICHD.	
ARIANA DE LA GARZA A.	SDUE SDUE	
José Antonio Pérez Sánchez	SDUE SDUE	

GRUPO DE TRABAJO DEL FISE
22 DE ABRIL 2021



NOMBRE	CARGO	FIRMA
Map Verónica Villegas Garza	Sra. Bienestar.	
Ramón Eduardo López Rey	Sra. Desarrollo Social	

CONSTRUCCIÓN DE MINI CIUDAD DE EDUCACIÓN VIAL

Presupuesto autorizado: 2.4 mdp

- Área de recorrido (sin banquetas, sin casitas, delimitado con pintura)
- Colocación de cerca y gradas existentes
- Edificio 1: baños de niños, bodega y oficina




Ampliación solicitada: 2.9 mdp

- Área de recorrido (con banquetas y casitas)
- Plaza cívica y recreativa arbolada con mesas y bancas
- Edificio 1: se agregan baños de adultos
- Edificio 2: 2 aulas y espacio de techado de comedor



PROYECTO COMPLETO

\$5.2 MDP

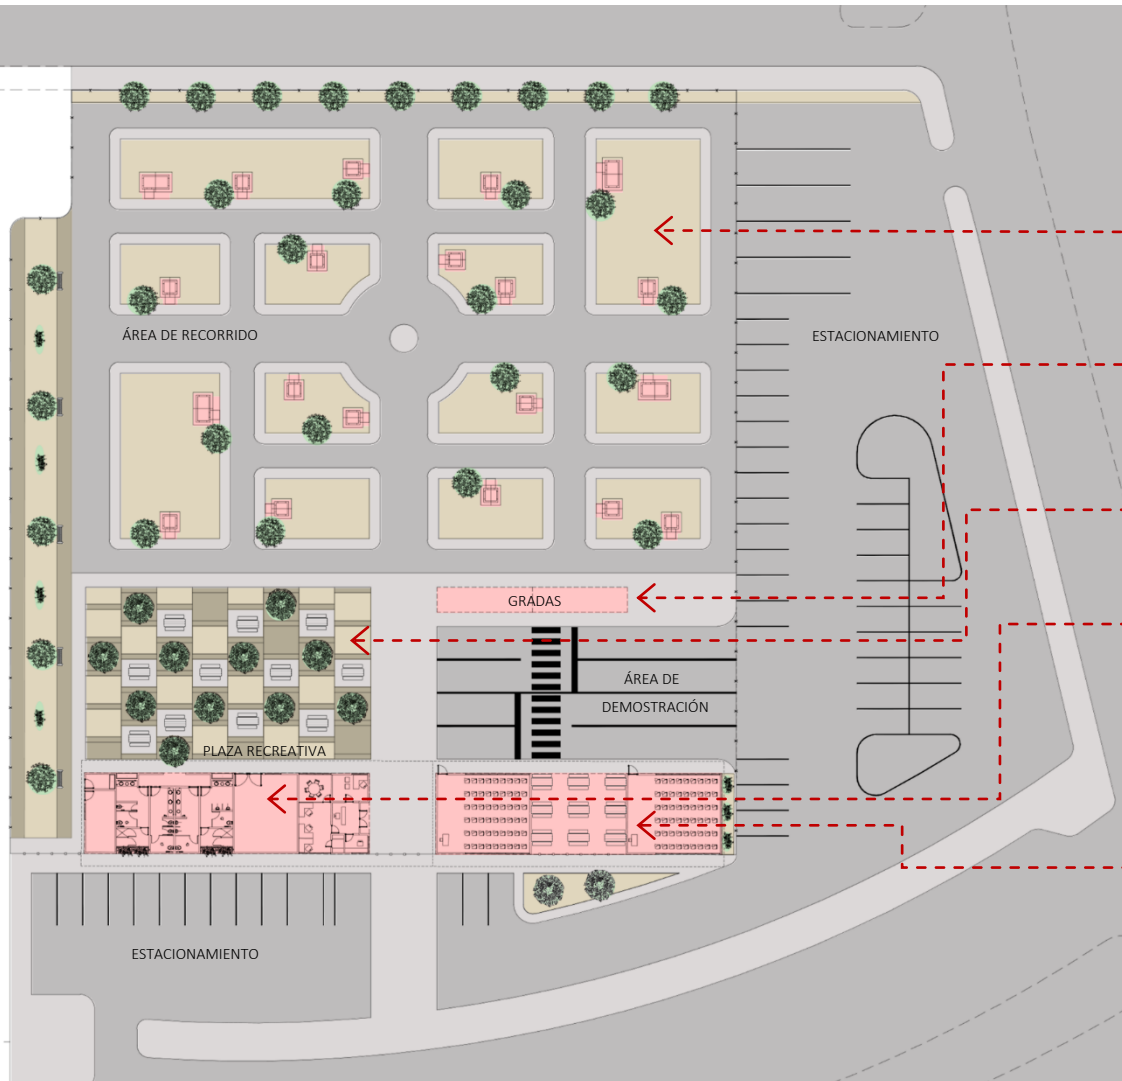

Área de recorrido:
Manzanas con banquetas, guarniciones, árboles, casas miniatura y señalética nueva

2 Gradas (reubicadas de la mini ciudad de Cd. Deportiva)


Plaza recreativa (arbolada, con mesas y bancas)

Edificio 1:
-Bodega de mantenimiento
-Sanitarios de adultos
-Sanitarios de niños
-Bodega de bicicletas
-Oficinas y vigilancia

Edificio 2:
-Aula 1 (54 niños)
-Aula 2 (54 niños)
-Área semi techada de comedor

ETAPA 1

\$2.4 MDP

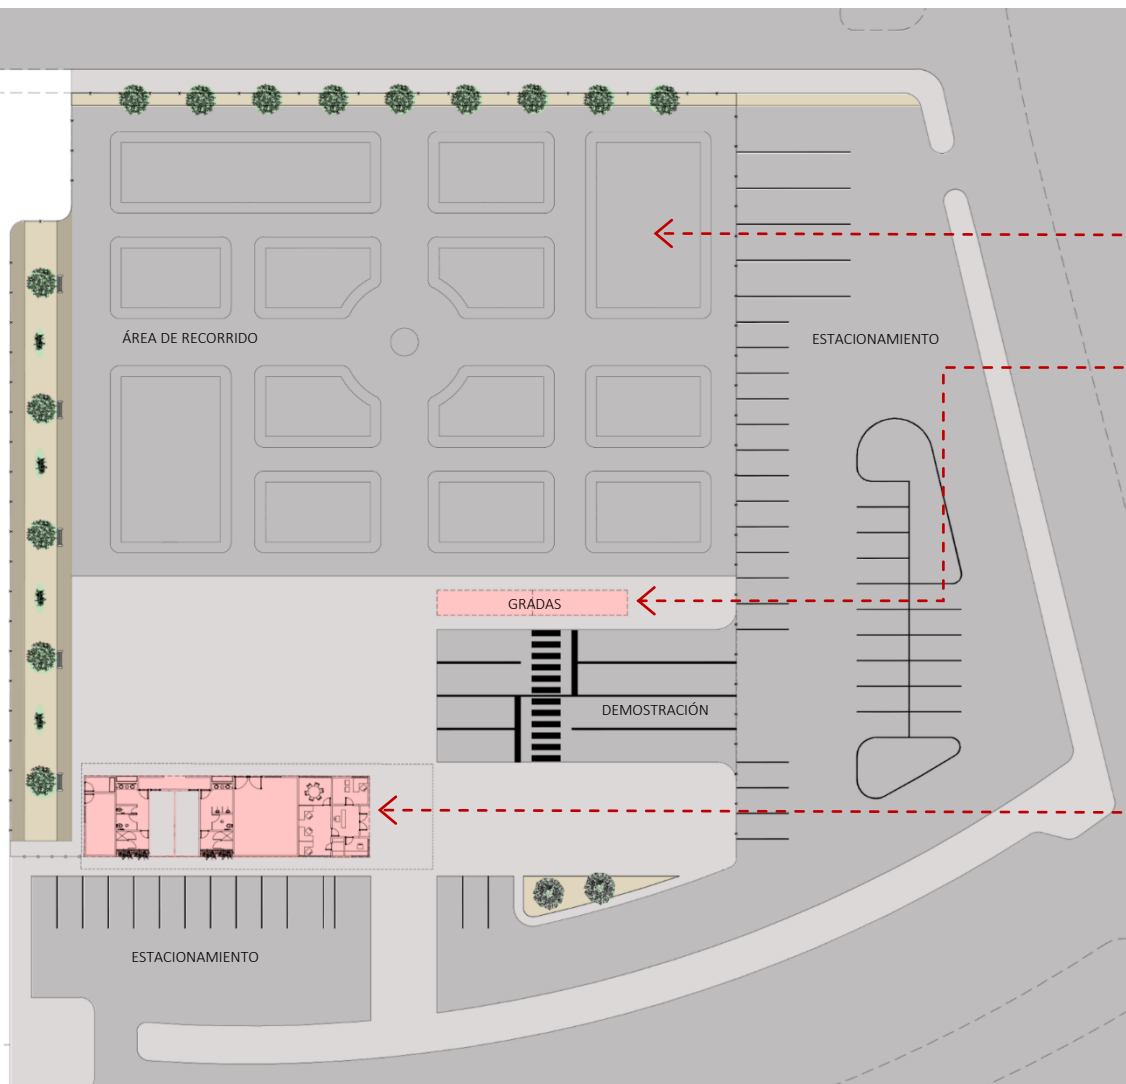

Área de recorrido:
Manzanas delimitadas con pintura en piso y señalética reutilizada de la mini ciudad de Cd. Deportiva.

2 Gradas (reubicadas de la mini ciudad de Cd. Deportiva)

Edificio 1:
-Bodega de mantenimiento
-Sanitarios
-Bodega de bicicletas usada como aula
-Oficinas y vigilancia

1ª ETAPA:

- La construcción de la primer etapa fue llevado a cabo por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Chihuahua (SCOP) bajo el contrato de obra pública con número 144-OP-026/20-DOP-OBRA SCOP asignando la obra bajo la siguiente licitación pública SCOP-LPN-034-2020 a la constructora AREN, S.A. DE C.V. en sociedad con AALIANZA, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. Invirtiendo en su primera etapa \$ 4 millones 639 mil 114.18 pesos.
- Durante la primera etapa de la obra se construye un aula para atención a niñas, niños y adolescentes, construcción de un aula para jóvenes y adultos, un consultorio médico y un consultorio de atención psicológica, además de baños, una cocina y un comedor.

2ª ETAPA:

- La construcción de la segunda etapa del Centro para el Desarrollo de la Infancia y la Adolescencia contemplara una suficiencia presupuestal por **\$4 millones 155 mil 456** pesos para que el centro quede operativo priorizando los siguientes conceptos de construcción:

Conceptos de Trabajo	Cantidad o Volumen	Precio Unitario	Importe
Preliminares	1	227,026.04	227,026.04
Obra Civil	1	585,872.20	585,872.20
Acabados	1	472,635.34	472,635.34
Cancelería	1	29,223.69	29,223.69
Puertas y Herrería	1	71,085.05	71,085.05
Instalación Hidrosanitaria	1	1,013,367.92	1,013,367.92
Instalación Gas	1	158,422.62	158,423.62
Instalación Eléctrica	1	429,090.37	429,099.37
Protección Civil	1	87,531.11	87,691.11
Estacionamiento y Accesos	1	507,865.89	507,865.89
SUBTOTAL:			\$3,582,290.23
I.V.A.			\$573,166.44
COSTO TOTAL:			\$4,155,456.67

ANEXO 3

Quedando pendiente una III ETAPA para la construcción de la cancha de usos múltiples



REHABILITACIÓN DE LA ALBERCA SANTO NIÑO (2A ETAPA)

ACCIONES	OBRA	COSTO PRESUPUESTADO 2019	INCREMENTO DEL 15% EN 2020	PRESUPUESTO 2020	PROPUESTA 2021 \$2'200.000.00	FUERA DE PRESUPUESTO	OBSERVACIONES
1	SERVICIOS SANITARIOS Y VESTIDORES DE DAMAS	\$ 304,796.31	\$ 73,719.43	\$ 380,515.76	\$ 380,515.76	\$ -	SE INCLUYEN ESTA ACCIONES EL EXPEDIENTE TÉCNICO 2020 POR \$2'200,000.00 (DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) MAS SIN EMBARGO SE QUEDAN SIN ATENDER LAS ACCIONES ABAJO DESCRITAS
2	SERVICIOS SANITARIOS Y VESTIDORES DE NIÑAS	\$ 383,721.07	\$ 57,558.16	\$ 441,279.23	\$ 441,279.23	\$ -	
3	SERVICIOS SANITARIOS Y VESTIDORES DE CABALLEROS	\$ 459,436.18	\$ 68,913.43	\$ 528,351.61	\$ 528,351.61	\$ -	
4	SERVICIOS SANITARIOS Y VESTIDORES DE NIÑOS	\$ 276,505.91	\$ 41,473.89	\$ 317,981.80	\$ 317,981.80	\$ -	POR LO QUE PARA PODER CONCLUIR ESTA OBRA ES NECESARIO DE PRESUPUESTO ADICIONAL
5	PINTURA GENERAL DEL INMUEBLE	\$ 487,087.19	\$ 73,063.08	\$ 560,150.27	\$ 331,871.61	\$ 228,278.66	
6	SISTEMA ELÉCTRICO Y ALUMBRADO	\$ 290,580.00	\$ 43,587.00	\$ 334,167.00		\$ 334,167.00	
7	TECHUMBRE	\$ 597,873.35	\$ 89,681.00	\$ 687,554.35		\$ 687,554.35	
		\$ 3,000,000.01	\$ 450,000.00	\$ 3,450,000.01	\$ 2,200,000.00	\$ 1,250,000.01	



PAVIMENTACIÓN DE 5 CALLES EN ALDAMA

RELACION DE CONCEPTOS PARA PRECIOS UNITARIOS DE CONCURSO

CONCURSO No.:

OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CD. ALDAMA CHIH.

TRAMO: VARIAS CALLES EL ALDAMA CHIH.

DESC. OBRA: APLICACIÓN DE MORTERO ASFALTICO Y RIEGO DE SELLO 3-A

A EJECUTAR:

OBRA A CARGO DE LA
SCOP

CONCEPTOS		CANTIDAD DE OBRA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	ESPEC.	DESCRIPCIÓN			
N-CTR-CAR-1-04 PAVIMENTOS					
006/14		CARPETAS ASFALTICA CON MEZCLA EN CALIENTE			
	J	Carpetas asfálticas con mezcla en caliente, por unidad de obra terminada:			
	01	Materiales asfálticos, por unidad de obra terminada:			
	a)	Emulsiones asfálticas en nego de liga (EP-451):			
		20,800.0	LT.	\$18.15	\$332,890.00
	c)	Cemento asfáltico tipo PG70-22 utilizado en carpeta asfáltica.			
		80,000.0	KG	\$17.48	\$1,398,400.00
	02	Carpetas de concreto asfáltico, por unidad de obra terminada:			
	a)	Compactado al noventa y cinco por ciento (95%), (3 cms) con tamaños máximos de 3/8":			
					\$0.00
	1)	Proveniente del banco que elija el contratista (EP-433).			
		615.0	M3	\$1,172.00	\$720,780.00
	08	Procedimiento de rebaje de la superficie de la carpeta actual mediante fresado con perfiladora de pavimento (EP-446 y EP-130).			
	b)	En un espesor de 3 cm. en tramos parciales.			
		160	M3	\$305.01	\$48,801.60
008/13		CAPAS DE RODADURA CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO			
	2)	Capas de rodadura por sistemas de riegos, por unidad de obra terminada:			
	b)	Carpetas de uno (1), dos (2) y tres (3) riegos, por unidad de obra terminada			
	1)	De un (1) nego:			
					\$0.00
	b)	Con material 3-A:			
					\$0.00
	1)	Proveniente del banco que elija el contratista (EP-428).			
		50.0	M3	\$624.00	\$31,200.00
	a)	Materiales asfálticos, por unidad de obra terminada:			
	3)	Emulsión diluida para riego superficial sobre el sello (EP-422).			
		2,650.0	LTS.	\$8.82	\$23,373.00
				SUBTOTAL	\$2,555,244.60
				18% IVA	\$408,839.14
				TOTAL	\$2,964,083.74

DESCRIPCION DE CALLES Y TRABAJOS A REALIZAR PARA LICITACION

CALLE CARMEN BERDAN (De la calle Roberto Gosa a Camilo Torres)

mortero asfáltico 3 cms.

AREA

M2

CALLE LEONARDO AGUIRRE (De calle Jesus Acosta a Leonardo Arzate)

mortero asfáltico 3 cms.

9750

M2

AVE. CONSTITUCION (De calle Segunda a calle Sexta)

fresado y mortero asfáltico 3 cms

1331

M2

PLAZA PRINCIPAL (Calle Juarez, Calle Segunda, Calle Hidalgo)

fresado y mortero asfáltico 3 cms

3850

M2

CALLE INSURGENTES (Carretera Ojinaga a Libramiento Juan Pablo)

Riego de sello 3-A

4400

M2
